


***Dismissione dell'impianto di depurazione
di Porto Valtravaglia
e collettamento all'impianto di depurazione
di Luino- Voldomino***

DESCRIZIONE COMMESSA

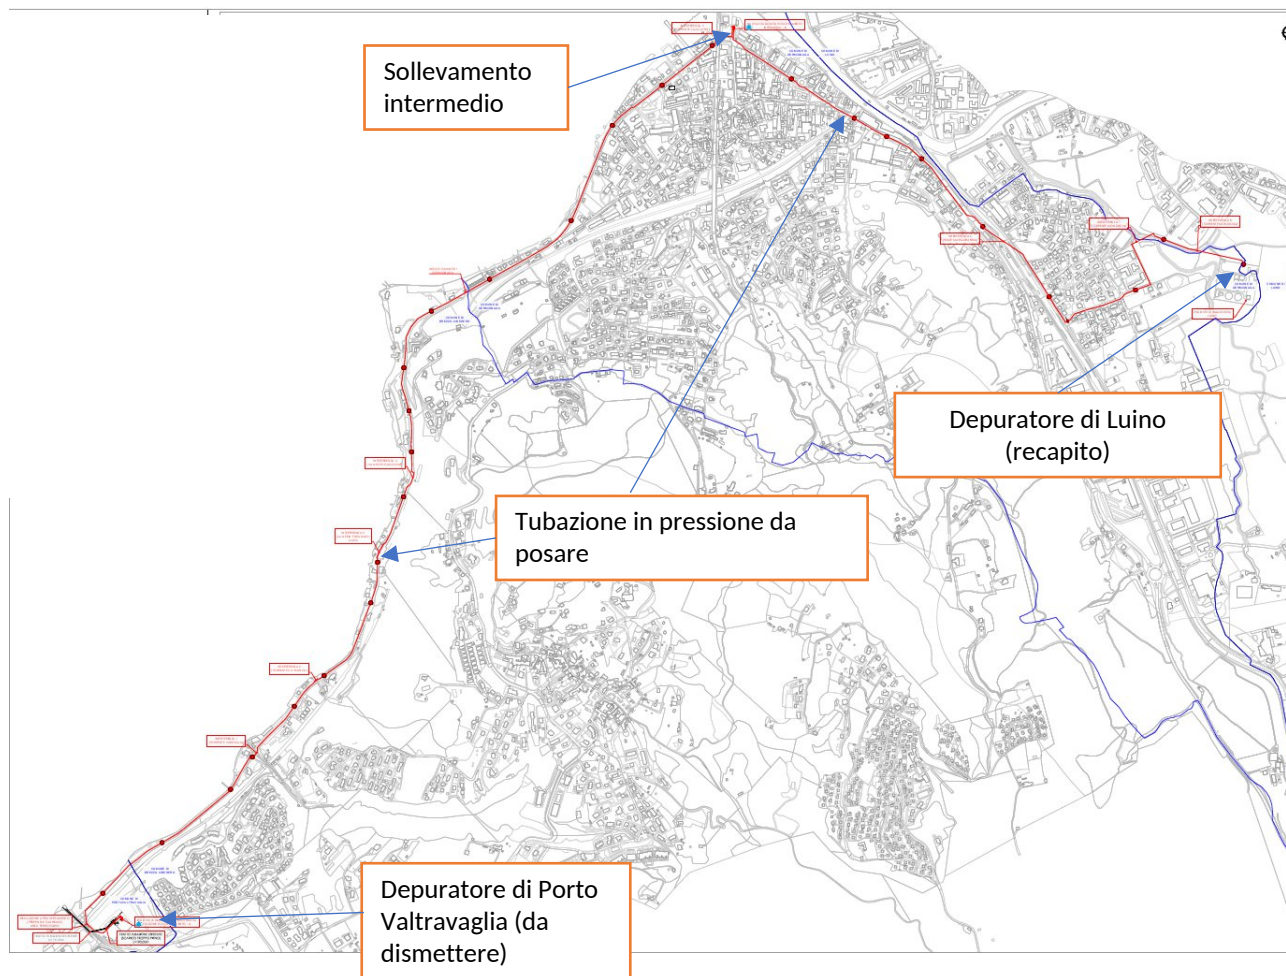

DE02DISTRIGO: Dismissione dell'impianto di depurazione di Porto Valtravaglia; collettamento al depuratore di Luino. Installazione sollevamento presso attuale depuratore di Porto Valtravaglia, sollevamento intermedio nel Comune di Germignaga, ~6 km rete in pressione DN400. **Commessa finalizzata al superamento di Procedura di Infrazione Comunitaria.**

Importo QE:
5.600.000,00

Importo Lordo lavori:
5.352.820,00

Importo Netto lavori:
4.603.109,02

INTERCONNESSIONE IDRAULICA A FINIRE LAVORI (A B C D)



Programma, in continuità ed a finire, dei lavori

PROGRAMMA A FINIRE DEI LAVORI SU SP 69

Gennaio - Aprile 2025



Esecuzione lavorazioni di scavo e posa pipeline DN 400 su SP 69 (chiusura per tratti della SP 69 - stesse modalità già condivise)

Avanzamento stimato, salvo imprevisti, lavorazioni da A verso B

INTERCONNESSIONE IDRAULICA A FINIRE LAVORI A → B → C → D



PROGRAMMA A FINIRE DEI LAVORI SU SP 69 ED IN AMBITO URBANO

Aprile-Luglio/Ago 2025



Esecuzione lavorazioni di scavo e posa pipeline DN 400 in parte su SP 69 (fino al punto C) ed in parte in ambito urbano

Avanzamento stimato, salvo imprevisti, lavorazioni da B verso D

INTERCONNESSIONE IDRAULICA A FINIRE LAVORI A → B → C → D



CRONOPROGRAMMA A FINIRE DEI LAVORI

Gennaio - Aprile 2025



Esecuzione lavorazioni di scavo e posa pipeline DN 400 su SP 69
(chiusura per tratti della SP 69 stesse modalità già condivise)

Avanzamento stimato, salvo imprevisti, lavorazioni da A verso B

Aprile-Luglio/Ago 2025



Scavo e posa pipeline DN 400 in parte residua su SP 69 (fino al
punto C) ed in parte in ambito urbano e chiusura work SSB

Avanzamento stimato, salvo imprevisti, lavorazioni da B verso D

Settembre-Ottobre 2025



Ripristini definitivi asfalti e chiusura di ogni lavorazione
presso ID Porto Valtravaglia (SSA)

Ottobre-Dicembre 2025



Prove Funzionali, Collaudi, Consegna al Gestore e Chiusura
Appalto

AVANZAEMENTO AL 10/12/2024 in Via Verdi Germignaga

